

Ramal do Apodi

Considerações iniciais



Tem como finalidade conduzir por gravidade a **vazão de até 40 m³/s**, em um percurso de cerca de **115 km** a partir do Eixo Norte do Pisf (Barragem de Caiçara) até o Reservatório de Angicos, de onde segue no leito do Rio Apodi para abastecimento de outro importante reservatório do estado do **Rio Grande do Norte**, a Barragem de Santa Cruz.



Ramal do Apodi

Fotos – Emboque túnel / Canal / Aqueduto



Ramal do Apodi

Fotos - Canais



Ramal do Apodi

Fotos – Túnel Major Sales



Ramal do Apodi

Fiscalização

TC: 019.599/2023-4

Relator: Min. Vital do Rêgo


Unidade Responsável: AudUrbana

Objetivo: fiscalizar a contratação das obras e serviços de engenharia para construção da Ramal do Apodi, no período compreendido entre 24/6/2021 e 30/6/2023.

Objeto da auditoria: contrato da execução das obras propriamente ditas, no valor de R\$ 938.510.000,00.

Execução: Com base na 25ª medição (junho/2023), a obra estava com um percentual de execução de 24,70%.

Data prevista para conclusão: 29/10/2025




Ramal do Apodi

Constatação principal

Inexistência de demonstração da economicidade na contratação de projeto baseado em **premissa superestimada da vazão** a ser demandada pelo Ramal do Apodi, sem levar em conta a necessidade da atualização dos estudos recomendados pela Agência Nacional de Águas no PNSH.

Propostas de encaminhamento:


- a) Oitiva: **MIDR** – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e **Alya Construtora S.A.**, antiga Construtora Queiroz Galvão S.A.
- b) Diligência ao **Consórcio Engecorps/VBA**
- c) Diligência ao **Consórcio Engecorps/Moisés Pires/Ceres**

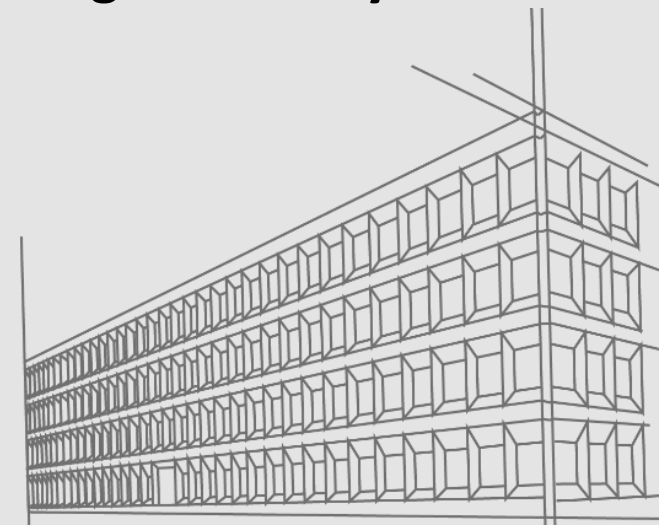

Ramal do Apodi

Situação atual do processo

O processo encontra-se atualmente aguardando pronunciamento do gabinete do Ministro Relator.

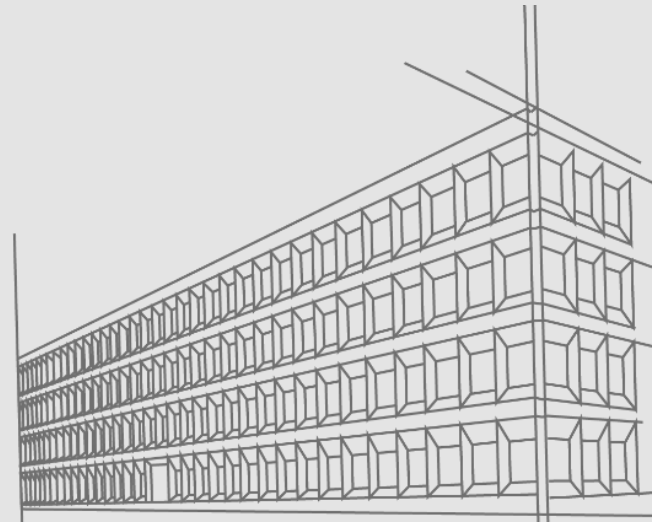

Ramal do Apodi

Situação atual do processo

O processo encontra-se atualmente aguardando pronunciamento do gabinete do Ministro Relator.

